Esbjerg Strandpromenade

Udbudstidsplan

Nyt klubhus for sejlere og surfere

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Accept	1 day?	Tue 10-03-16	Tue 10-03-16
2	Nedbrydning	5 days	Mon 10-03-22	Fri 10-03-26
3	Byggepladsindretning	10 days	Mon 10-03-22	Fri 10-04-02
4	Muldafrømning	1 day?	Mon 10-03-29	Mon 10-03-29
5	Terrænregulering	10 days	Tue 10-03-30	Mon 10-04-12
6	Fundamentsarbejder	10 days	Tue 10-04-13	Mon 10-04-26
7	Kloakarbejder	10 days	Tue 10-04-13	Mon 10-04-26
8	VVS-arbejder	77 days?	Tue 10-04-27	Wed 10-08-11
9	Terrændæk	5 days	Tue 10-04-27	Mon 10-05-03
10	El-arbejder	77 days?	Tue 10-04-27	Wed 10-08-11
11	Vægelementmontage	3 days	Tue 10-05-04	Thu 10-05-06
12	Dækelementmontage	3 days	Fri 10-05-07	Tue 10-05-11
13	In situdæk	10 days	Wed 10-05-12	Tue 10-05-25
14	Lette vægge stueplan	20 days	Wed 10-05-12	Tue 10-06-08
15	Lette vægge kælderplan	5 days	Wed 10-05-26	Tue 10-06-01
16	Spærmontage	10 days	Wed 10-05-26	Tue 10-06-08
17	Tagarbejder	15 days	Wed 10-06-09	Tue 10-06-29
18	Vinduesmontage	5 days	Wed 10-06-09	Tue 10-06-15
19	Lukket hus	1 day?	Wed 10-06-23	Wed 10-06-23
20	Zink på façade	15 days	Wed 10-06-16	Tue 10-07-06
21	Betonslidlag	5 days	Wed 10-05-26	Tue 10-06-01
22	Flisearbejder	15 days	Wed 10-06-02	Tue 10-06-22
23	Trægulve incl opbygning	10 days	Thu 10-06-24	Wed 10-07-07
24	Terrassegulve incl. opbygning	20 days	Wed 10-06-09	Tue 10-07-06
25	Rampe	10 days	Wed 10-06-30	Tue 10-07-13
26	Trappe	5 days	Wed 10-07-07	Tue 10-07-13
27	Komplettering	20 days	Wed 10-07-07	Tue 10-08-03
28	Malerarbejder	20 days	Thu 10-07-08	Wed 10-08-04
29	Lofter	10 days	Thu 10-07-22	Wed 10-08-04
30	Snedkerarbejder	10 days	Thu 10-07-22	Wed 10-08-04
31	Inventar	5 days	Thu 10-07-22	Wed 10-07-28
32	Slutmontage	5 days	Thu 10-08-05	Wed 10-08-11
33	Byggeplads afrigning	5 days	Thu 10-08-12	Wed 10-08-18
34	Terrænbefæstelse	15 days	Wed 10-07-21	Tue 10-08-10
35	Gartnerarbejder	15 days	Wed 10-07-21	Tue 10-08-10
36	Døre	2 days	Thu 10-08-12	Fri 10-08-13
37	Mangelgennemgang	2 days	Thu 10-08-12	Fri 10-08-13
38	Mangeludbedring	5 days	Mon 10-08-16	Fri 10-08-20
39	Rengøring	1 day?	Mon 10-08-23	Mon 10-08-23
40	Aflevering	1 day	Mon 10-08-23	Mon 10-08-23
41	Dagbodsbehæftiget termin	0 days	Mon 10-08-23	Mon 10-08-23

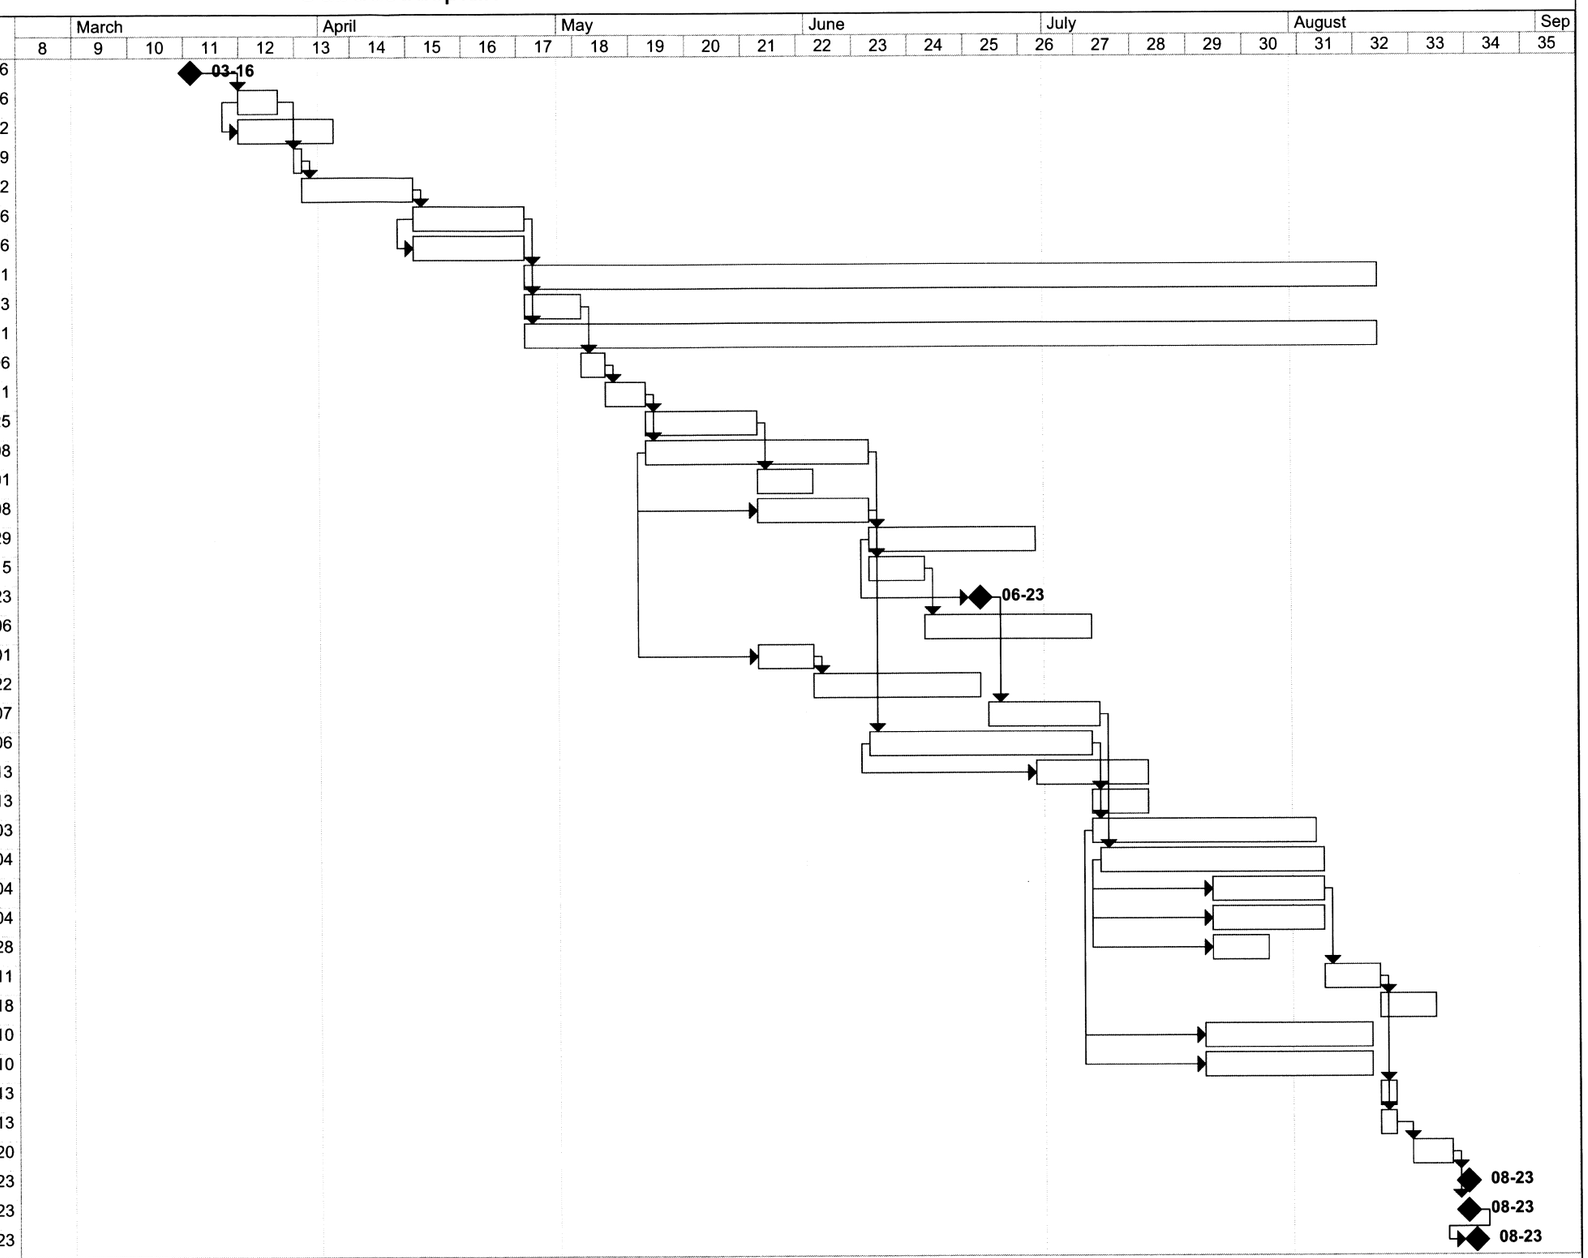

Project: AE00147-2-HHB
Date: Wed 10-02-10

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
